


Id	Status	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	z/08		01/Fev/09		22/Mar/09		
							T	Q	Q	S	S	D	
1	Concluída ✓	Atividades preliminares e estratégicas	25 dias	Seg 09/02/09	Sex 13/03/09	100%							
2	Concluída ✓	Apresentar projeto ao Colégio de Diretores	1 dia	Seg 09/02/09	Seg 09/02/09	100%							
3	Concluída ✓	Aprovação da iniciativa pelo Colégio de Diretores	11 dias	Sex 20/02/09	Sex 06/03/09	100%							
4	Concluída ✓	Formar equipe de BPM	1 dia	Sex 13/03/09	Sex 13/03/09	100%							
5	Concluída ✓	Reunião Preliminar com equipe de BPM	1 dia	Sex 13/03/09	Sex 13/03/09	100%							
6	Concluída ✓	Criar plano de divulgação da iniciativa	70 dias?	Seg 09/03/09	Sex 12/06/09	100%							
7	Concluída ✓	1a fase de divulgação	1 dia?	Seg 09/03/09	Seg 09/03/09	100%							
8	Concluída ✓	2a fase	31 dias	Seg 01/05/09	Sex 12/06/09	100%							
9	Concluída ✓	Criação do site do projeto	6 dias	Sex 27/03/09	Sex 03/04/09	100%							
10	Concluída ✓	Montar o escritório de BPM	16 dias	Seg 23/03/09	Seg 13/04/09	100%							
11	Concluída ✓	Treinamentos	61 dias?	Seg 02/03/09	Seg 25/05/09	100%							
12	Concluída ✓	Preparar treinamento equipe	15 dias	Seg 02/03/09	Sex 20/03/09	100%							
13	Concluída ✓	Treinamento equipe em BPM	5 dias?	Seg 23/03/09	Sex 27/03/09	100%							
14	Concluída ✓	Preparar treinamento BPM estratégico	9 dias?	Seg 20/04/09	Qui 30/04/09	100%							
15	Concluída ✓	Curso de BPM estratégico - Reitores e diretores	1 dia	Seg 18/05/09	Seg 18/05/09	100%							
16	Concluída ✓	Curso de BPM estratégico- diretores adjuntos e gerentes	1 dia	Seg 25/05/09	Seg 25/05/09	100%							
17	Concluída ✓	Criação do Manual de Gestão de Processos do IFES	16 dias	Sex 27/03/09	Sex 17/04/09	100%							
18	Concluída ✓	Criação da Visão Global de Processos	24 dias	Seg 30/03/09	Qui 30/04/09	100%							
19	Concluída ✓	Gerenciar Governança	24 dias	Seg 30/03/09	Qui 30/04/09	100%							
20	Concluída ✓	Gerenciar e desenvolver pessoas	24 dias	Seg 30/03/09	Qui 30/04/09	100%							
21	Concluída ✓	Gerenciar infraestrutura	24 dias	Seg 30/03/09	Qui 30/04/09	100%							
22	Concluída ✓	Gerenciar Recursos Financeiros	24 dias	Seg 30/03/09	Qui 30/04/09	100%							
23	Concluída ✓	Gerenciar Desenvolvimento Institucional	23,4 dias	Seg 30/03/09	Qui 30/04/09	100%							
24	Concluída ✓	Gerenciar Ensino	24 dias	Seg 30/03/09	Qui 30/04/09	100%							
25	Concluída ✓	Gerenciar Pesquisa	24 dias	Seg 30/03/09	Qui 30/04/09	100%							
26	Concluída ✓	Gerenciar Extensão e Produção	24 dias	Seg 30/03/09	Qui 30/04/09	100%							
27	Concluída ✓	Priorizar processos a serem modelados - estudados	20 dias	Seg 04/05/09	Sex 29/05/09	100%							
28	Concluída ✓	Validação dos resultados da Visão Global de Processos com Dire	1 dia	Sex 22/05/09	Sex 22/05/09	100%							
29	Tarefa futura 📅	Selecionar ferramentas adicionais de implantação de processos	46 dias?	Sex 10/04/09	Sex 18/09/09	60%							
30	Tarefa futura 📅	Adquirir ferramentas adicionais para gestão e implantação de pro	90 dias	Sex 18/09/09	Sex 22/01/10	0%							
31	Tarefa futura	Processos Piloto	261,4 dias?	Seg 01/06/09	Ter 01/06/10	24%							
32	Tarefa futura	Modelar e otimizar processos Piloto	61 dias?	Seg 01/06/09	Seg 24/08/09	33%							
33	Tarefa futura 📅	Gerenciar processos (protocolo)	61 dias?	Seg 01/06/09	Seg 24/08/09	30%							

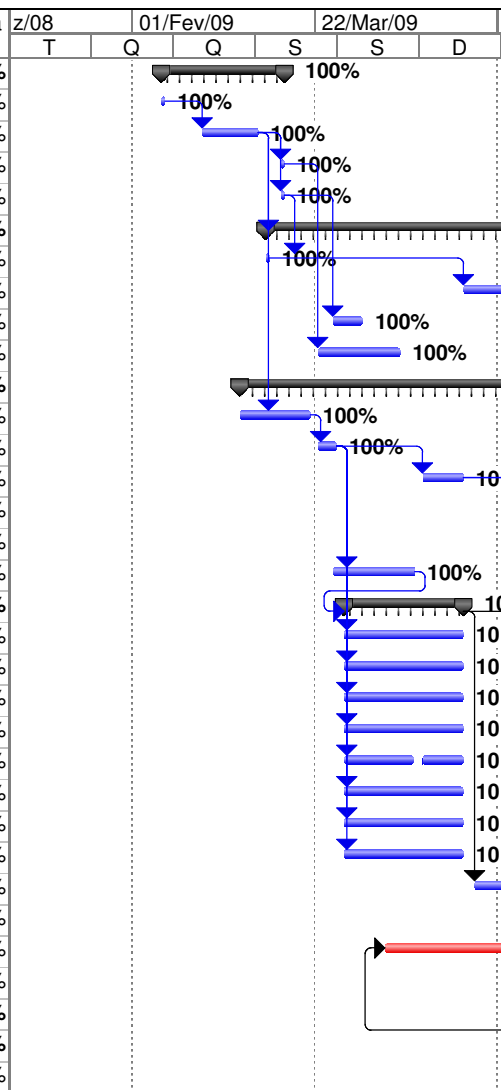


Projeto: BPM Data: Qui 25/06/09	Crítica		Linha de base		Resumo do projeto	
	Divisão crítica		Divisão da linha de base		Tarefas externas	
	Andamento crítico		Etapa da linha de base		Etapa externa	
	Tarefa		Etapa		Data limite	
	Divisão		Andamento do resumo			
	Andamento da tarefa		Resumo			

Id	Status	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	z/08		01/Fev/09			22/Mar/09		
							T	Q	Q	S	S	D		
34	Tarefa futura	Gerenciar compras	61 dias?	Seg 01/06/09	Seg 24/08/09	60%								
35	Tarefa futura	Gerenciar contratos	61 dias?	Seg 01/06/09	Seg 24/08/09	20%								
36	Tarefa futura	Gerenciar RH - tópico a definir	61 dias?	Seg 01/06/09	Seg 24/08/09	20%								
37	Tarefa futura	Implantar processos Piloto	61 dias?	Sex 22/01/10	Seg 19/04/10	0%								
38	Tarefa futura	Monitorar processos Piloto	31 dias?	Seg 19/04/10	Ter 01/06/10	0%								
39	Tarefa futura	Realinhar planejamento do BPM - Atividade continuada	160 dias?	Ter 25/08/09	Seg 05/04/10	0%								
40	Tarefa futura	Atualização da Equipe de BPM	160 dias?	Ter 25/08/09	Seg 05/04/10	0%								
41	Tarefa futura	Decidir pela contratação de consultoria externa	6 dias?	Ter 25/08/09	Ter 01/09/09	0%								
42	Tarefa futura	Continuidade do projeto	128 dias?	Seg 19/04/10	Qui 14/10/10	0%								
43	Tarefa futura	Modelar e otimizar processos indicados adicionais	86 dias?	Seg 19/04/10	Ter 17/08/10	0%								
44	Tarefa futura	Implantar processos indicados adicionais	21 dias?	Ter 17/08/10	Qua 15/09/10	0%								
45	Tarefa futura	Monitorar processos indicados adicionais	21 dias?	Qua 15/09/10	Qui 14/10/10	0%								

Projeto: BPM
Data: Qui 25/06/09

Crítica		Linha de base		Resumo do projeto	
Divisão crítica		Divisão da linha de base		Tarefas externas	
Andamento crítico		Etapa da linha de base		Etapa externa	
Tarefa		Etapa		Data limite	
Divisão		Andamento do resumo			
Andamento da tarefa		Resumo			

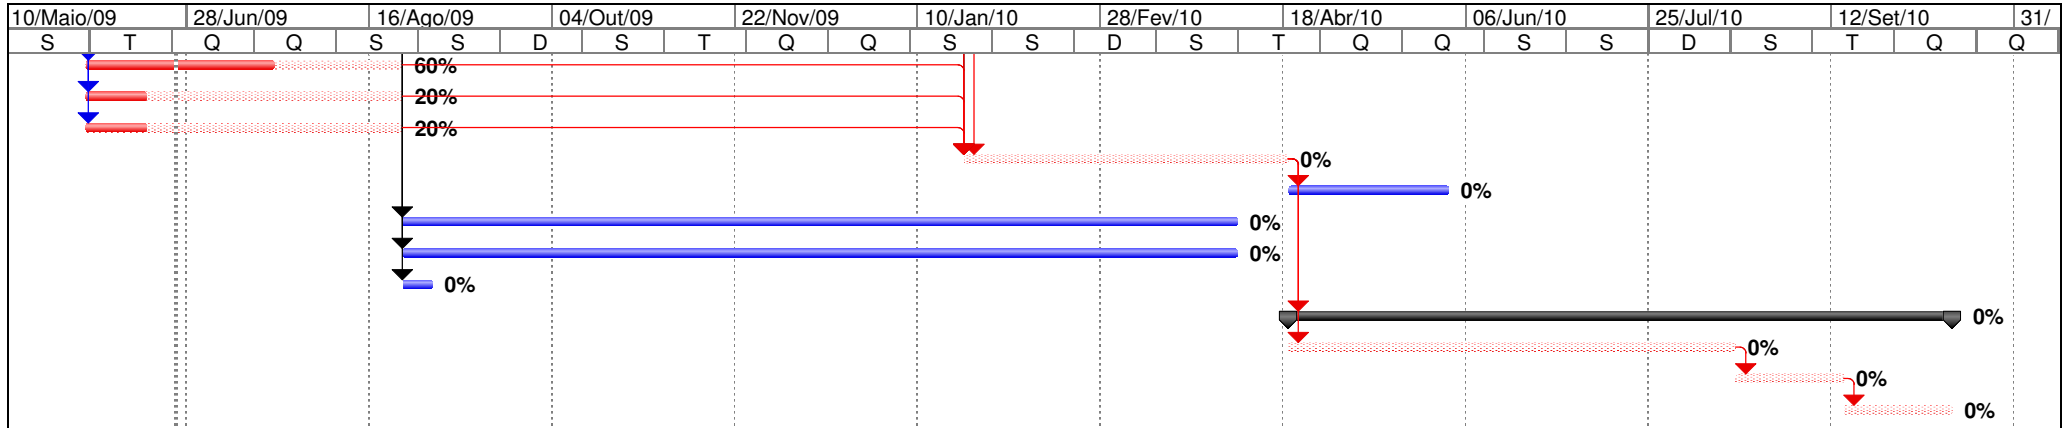

Projeto: BPM Data: Qui 25/06/09	Crítica		Linha de base		Resumo do projeto	
	Divisão crítica		Divisão da linha de base		Tarefas externas	
	Andamento crítico		Etapa da linha de base		Etapa externa	
	Tarefa		Etapa		Data limite	
	Divisão		Andamento do resumo			
	Andamento da tarefa		Resumo			
